


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	20/04/08	20/04/08	0
2	B	Preparazione cantiere	21/04/08	23/04/08	2
3	C.1	Manutenzione generalizzata sentiero	24/04/08	20/06/08	57
4	C.2	Fornitura e posa in opera segnaletica verticale, tabelle informative e tabelle segnavia	15/05/08	20/06/08	36
5	C.3	Manutenzioni viminate, murature, canalette, scalinate, staccionate, posa in opera ghiaia, ecc.	02/05/08	01/07/08	60
6	C.4	Manutenzione di capannine informative	05/06/08	14/08/08	70
7	C.5	Manutenzione tratti allargamento sentiero, attraversamento torrenti, passerelle in legno.	02/05/08	11/06/08	40
8	C.6	Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale, ripristino tabella segnavia e rinfresco verniciatura	02/05/08	21/07/08	80
9	C.7	Intervento di decespugliamento successivo a quello generalizzato	01/07/08	31/07/08	30
10	E	Pulizie e smobilizzo	15/08/08	17/08/08	2
11	F	Fine lavori	17/08/08	18/08/08	1

DURATA (gg)

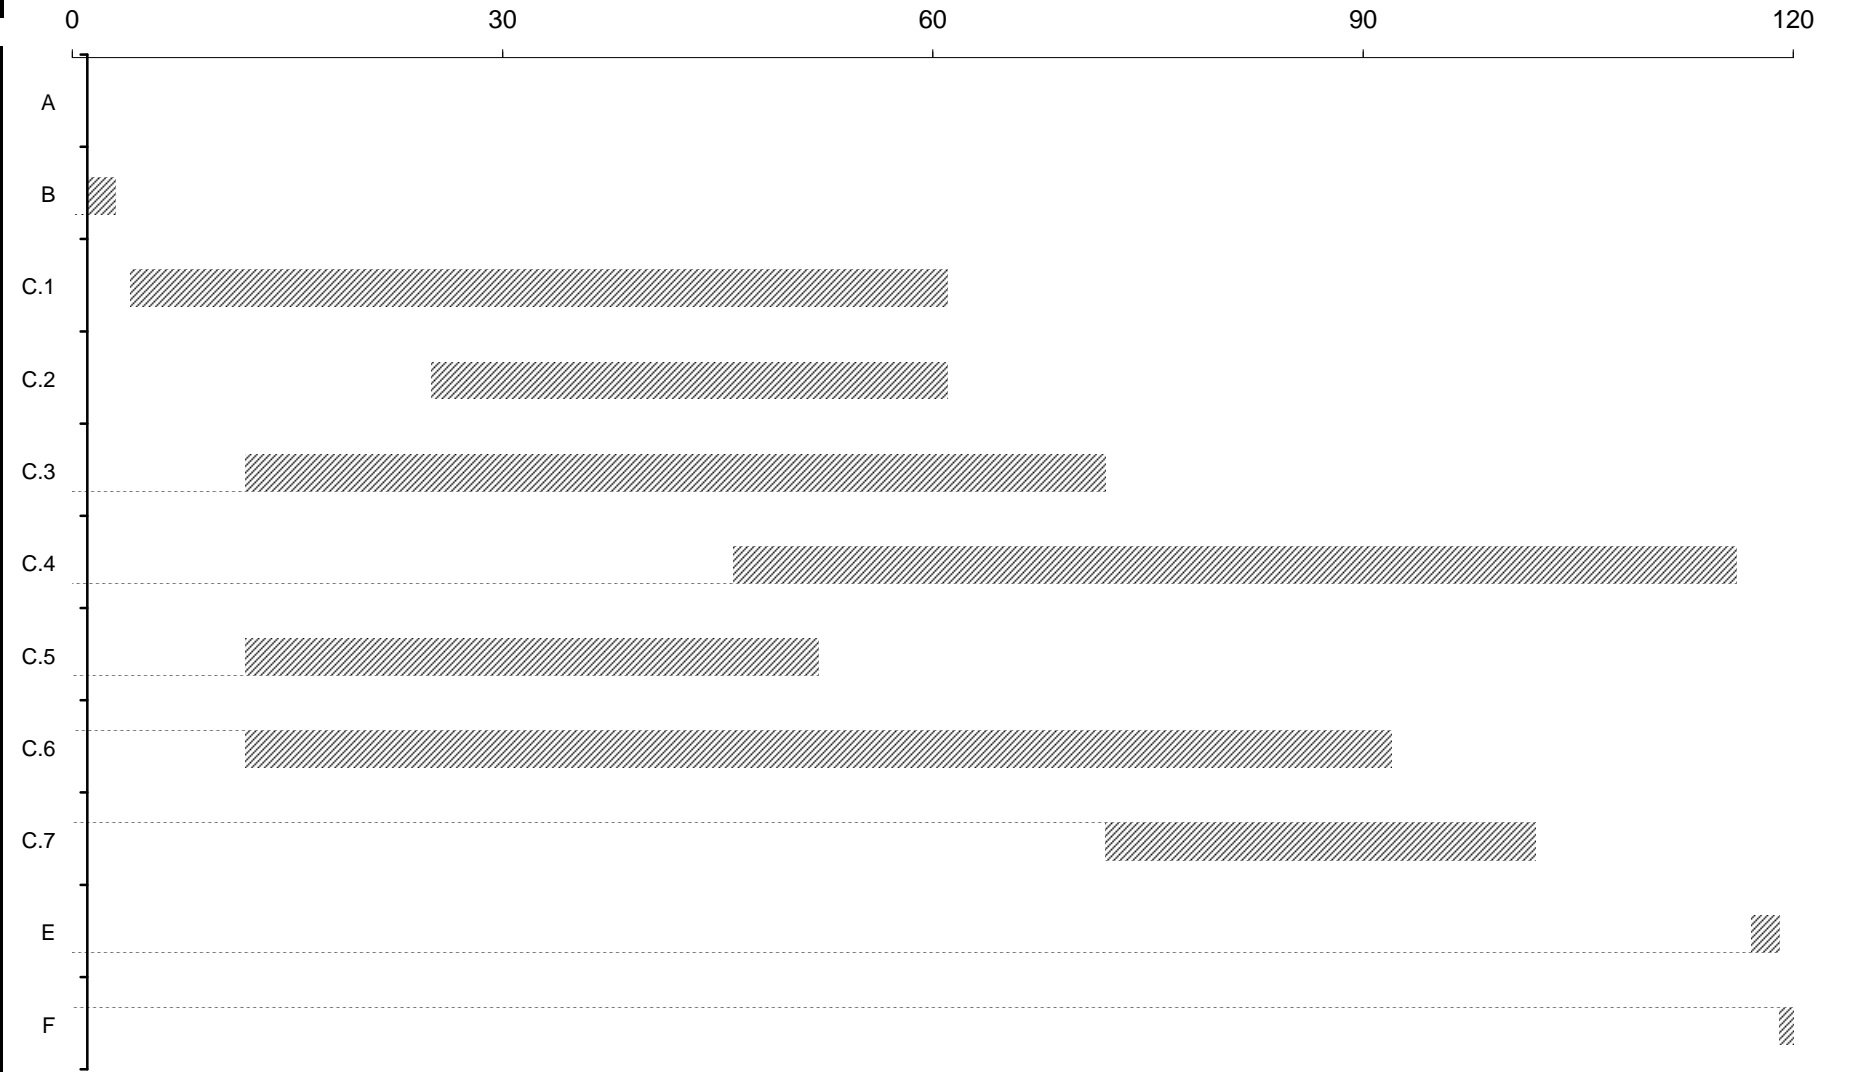

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
120 gg

TC **120** gg.
naturali consecutivi
